

GESTION PAR PROJETS



Classes: GLSI3 et MPDS2
2024-2025

Faouzi SALEM

Plan du cours

Livrables	slides	Statut
Section1: Cadre du management de Projet		
CH1-1 : Organisation et Management par projets		
CH1-2: Méthodes PERT / VA pour le mgt des projets		
CH1-3: Agilité		
Section2: Normes et méthodes de mangement des projets		
CH2-1: Normes ISO21500 et du PMBOK		
Ch2-2: le mgt des projets selon PMBOK v7		
Section3- Outils de mgt des projets MS Project/ Jira ...		
Mini Projet 1 « Cycles de vie des projets classiques vs agiles » Mini Projet2 « les méthodes de sélection des projets » Mini projet3: « Scrum (cycle de vie, roles, artifacts) et outils Jira Mini Projet4: « Agilité à l'échelle: Méthode SAFe » Mini Projet5: « MS project et etude de cas » Mini Projet6: « Modèles, Techniques et Artéfacts en Mgt des projets selon Guide PMBOK®):»		

Organisation et Stratégies(1)


❑ Une Organisation: un groupement ouvert sur son environnement structuré et orienté vers la réalisation d'un but, elle mobilise et organise les moyens humains matériels, financiers et informationnels.

❑ Au sens large une organisation est **toute entité qui crée de la valeur** et ayant au moins les **trois éléments** :

- ❑ Un but, une finalité
- ❑ Une structure, un formalisme
- ❑ des ressources (RH, moyens...)


❑ Le management d'une organisation peut être décrit en 3 niveaux:

- Stratégique
- Tactique
- opérationnel

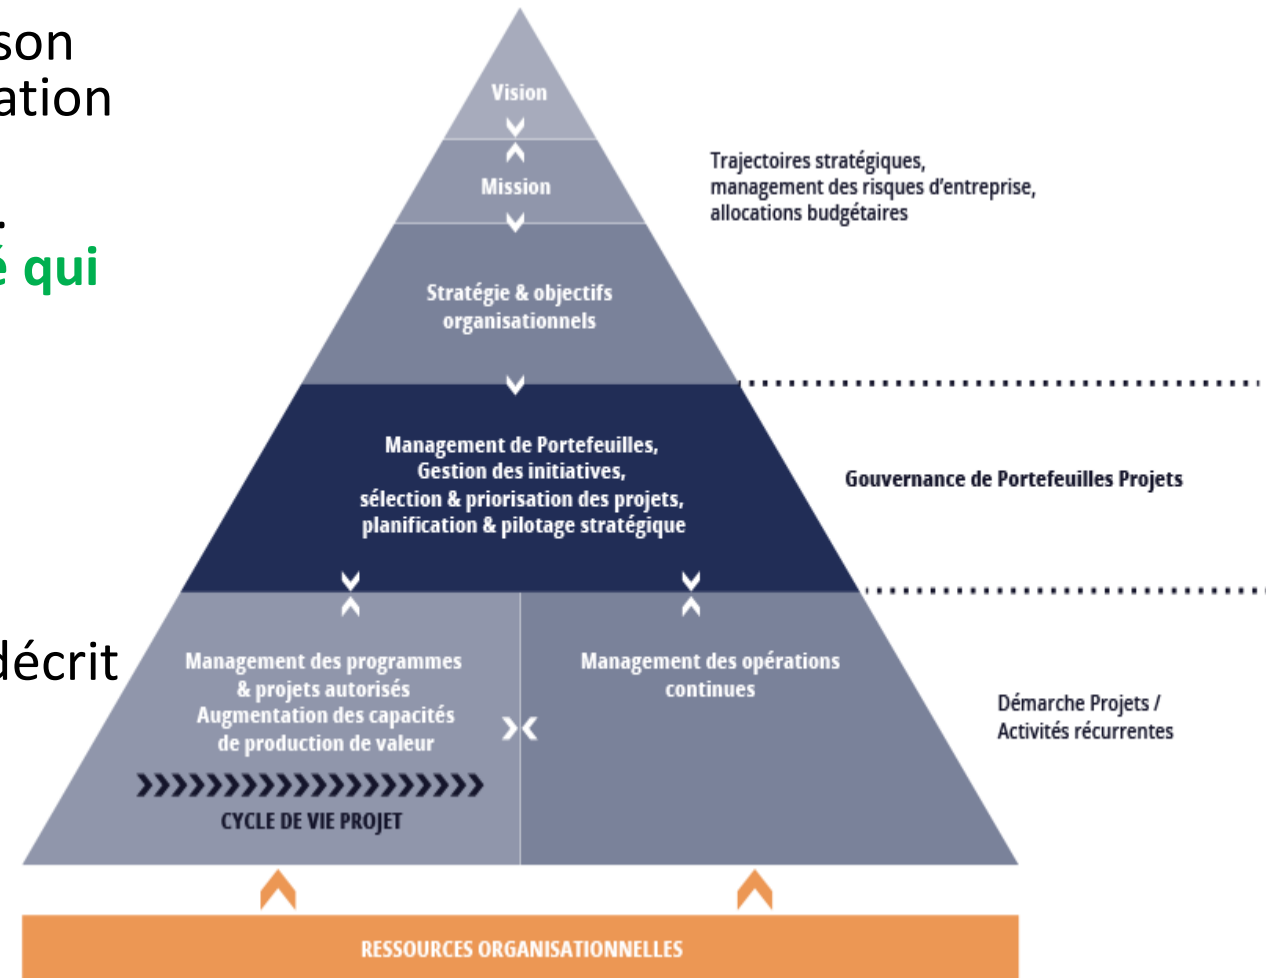

Organisation et Stratégies (2)



la méthode Hoshin Kanri de déploiement de la stratégie

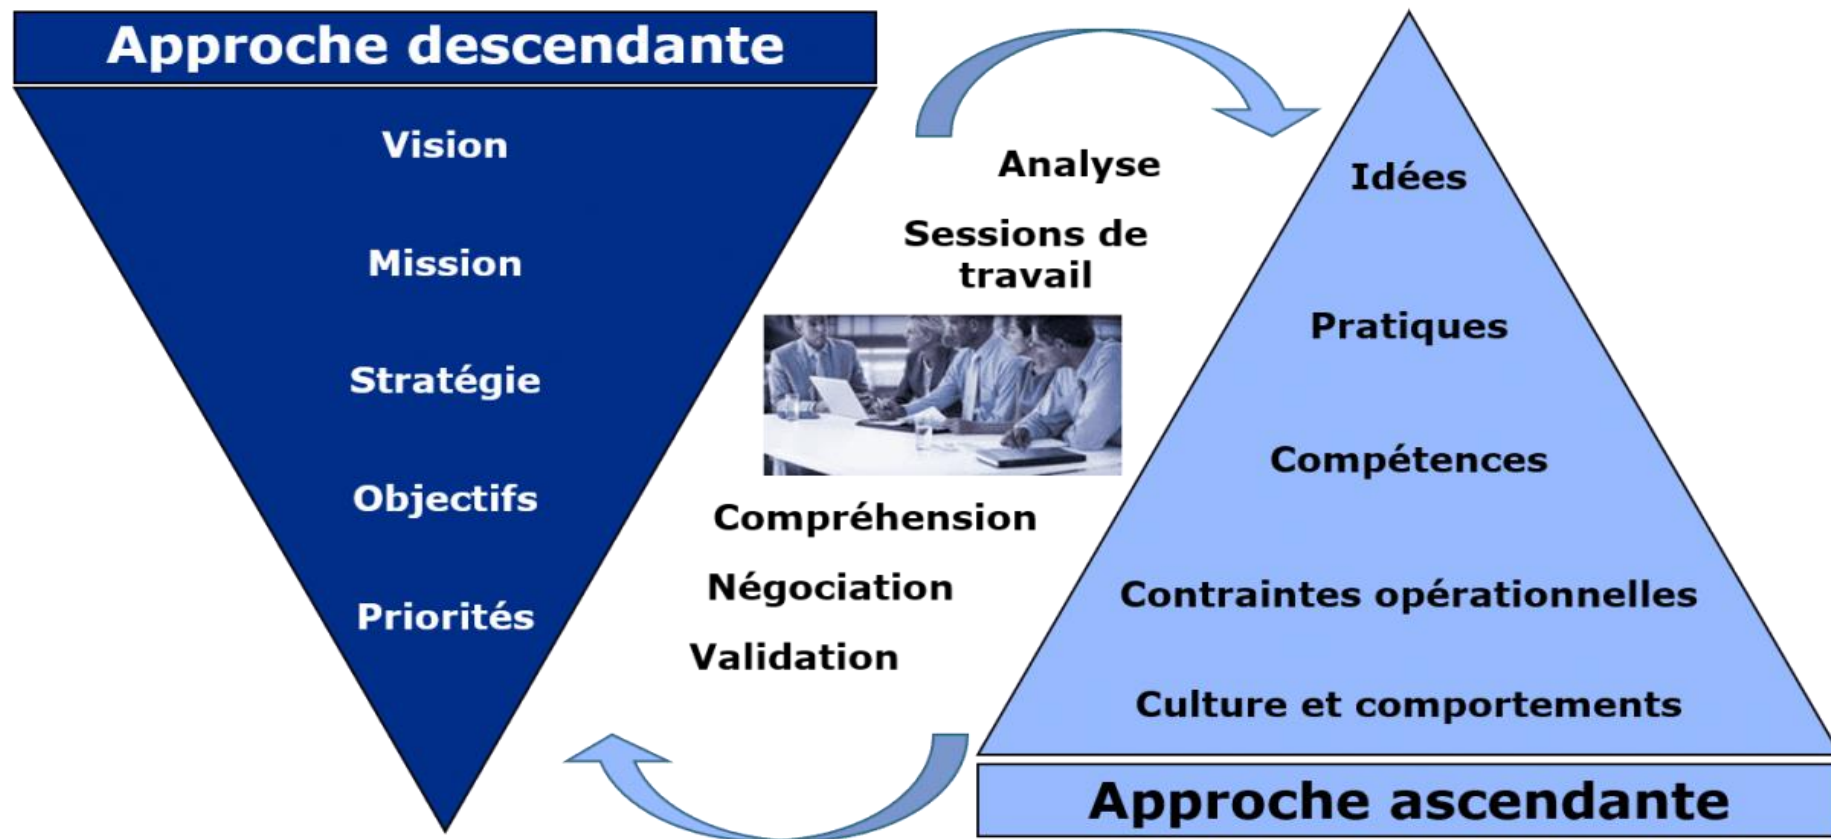

Organisation et stratégies (3)

PRODECYS

LE PORTEFEUILLE AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE

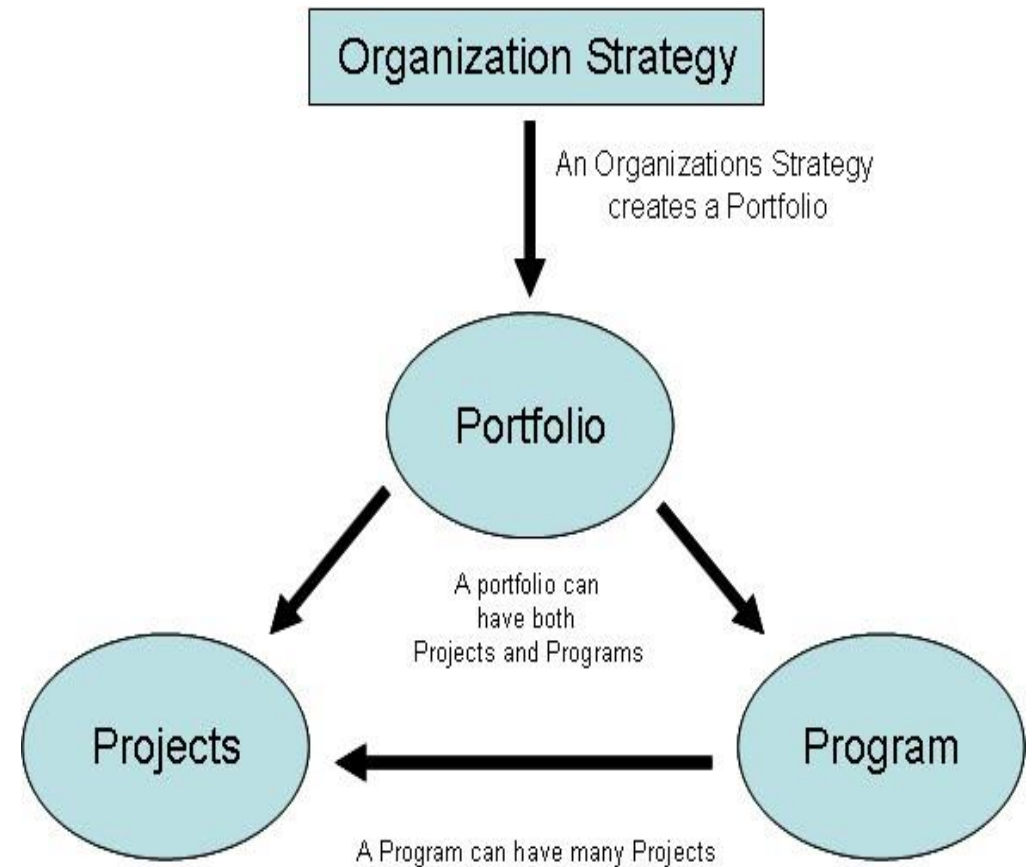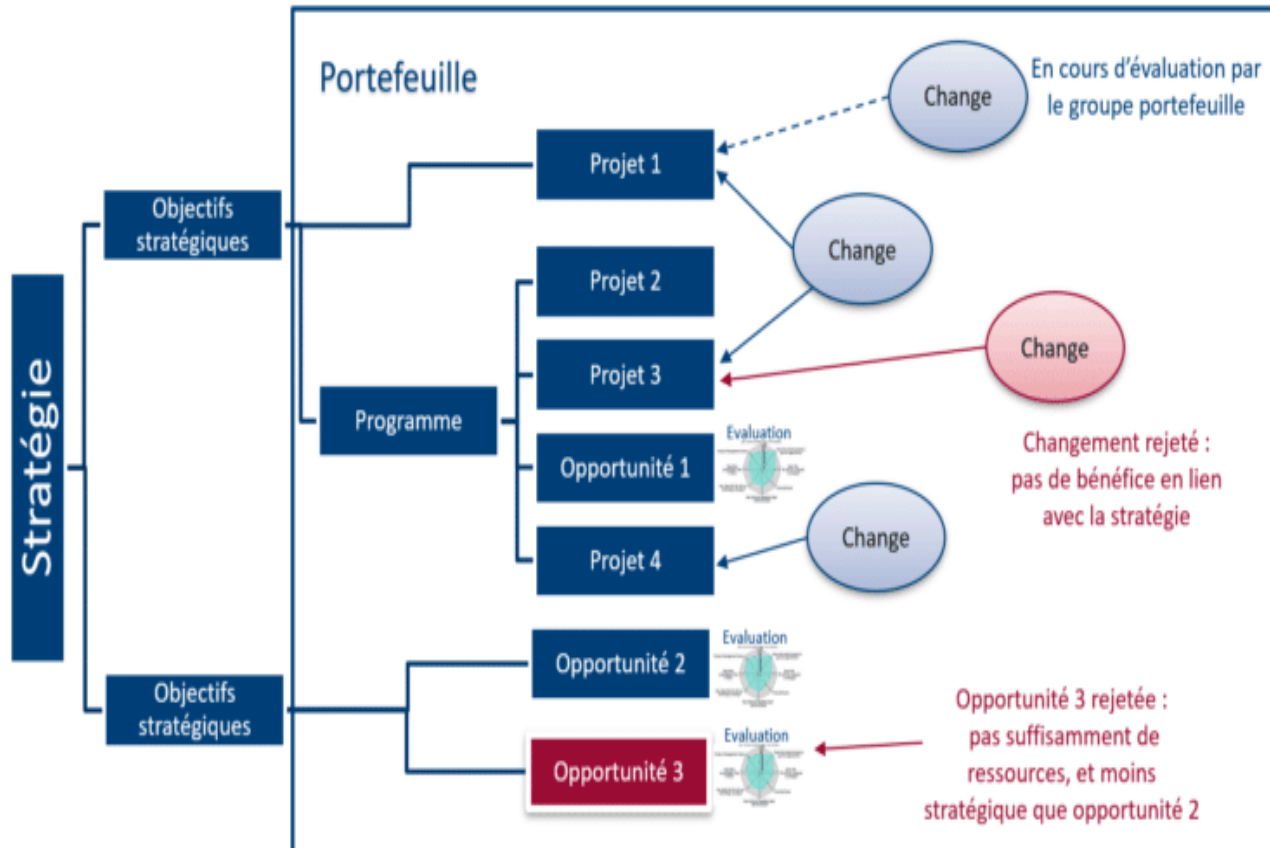

Organisation et Gestion par Projets

Gestion
de projet

≠

Gestion
par projet

Présentation du référentiel du PMI

Le lien entre la gestion de portefeuille et la gouvernance



Figure 1.2 page 8

La relation entre la gestion de portefeuille et la stratégie organisationnelle


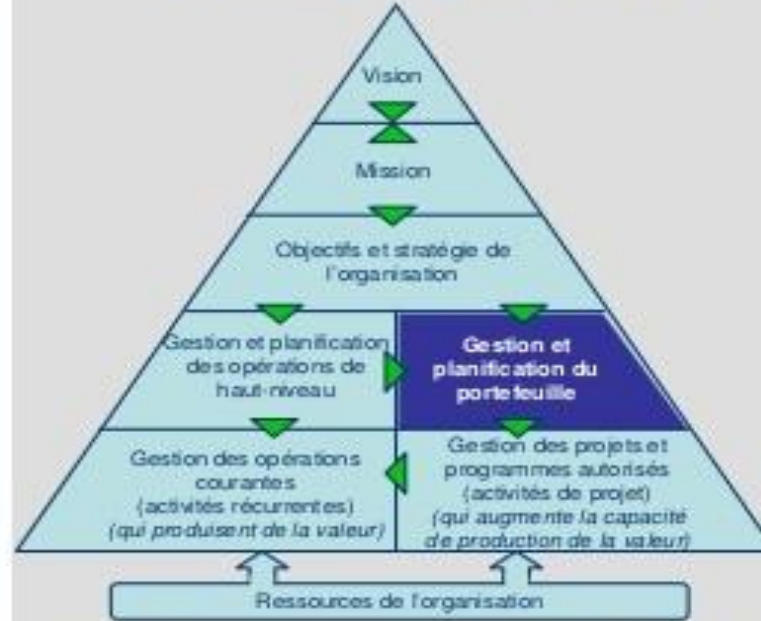


Figure 1.3 page 9

Organisation et Gestion par Projets (2)

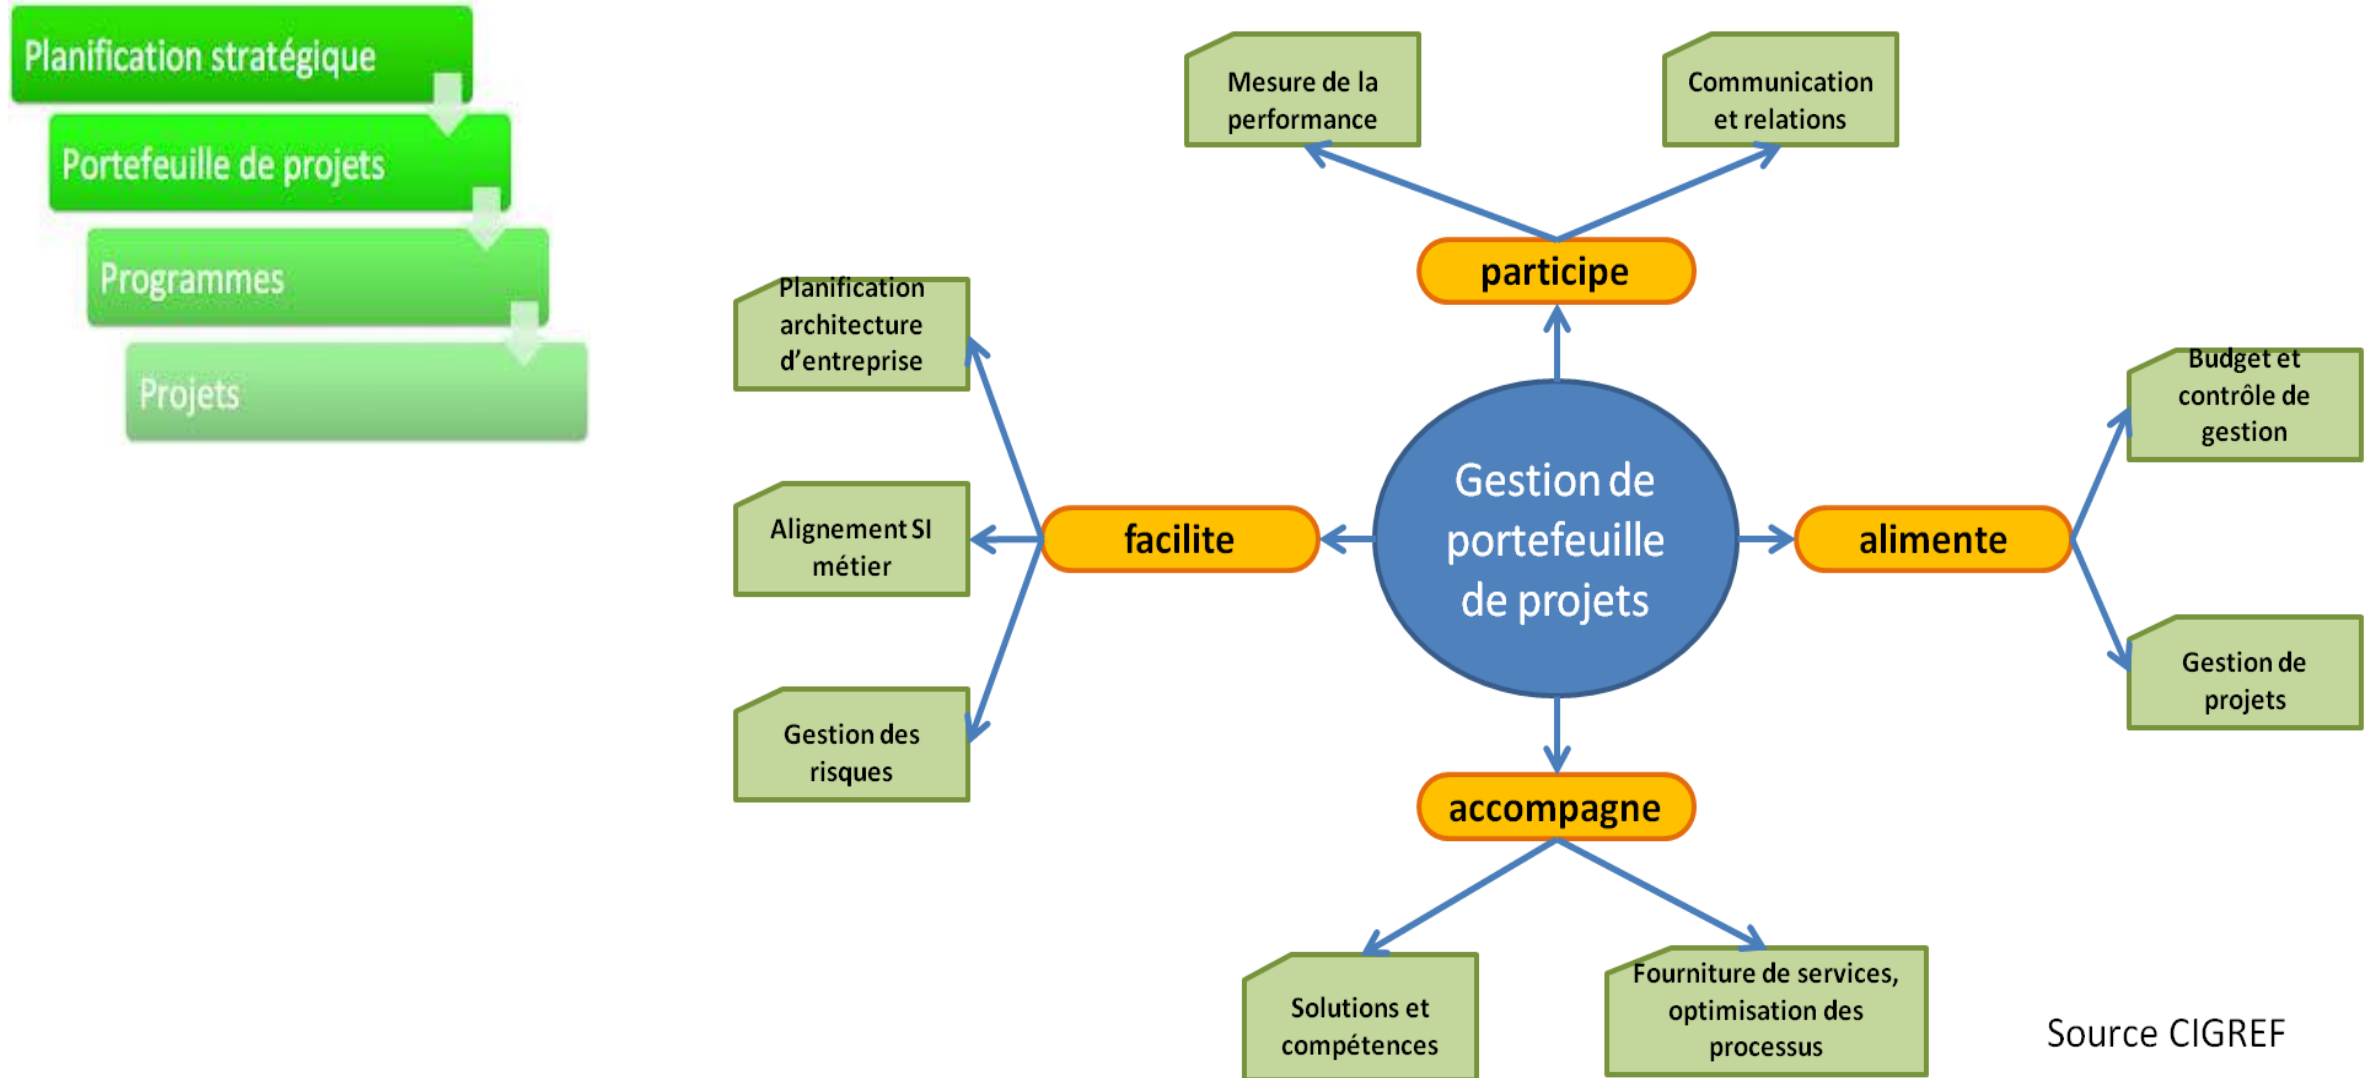


Source CIGREF

Organisation et Gestion par Projets (4)



Organisation et Gestion par Projets (5)

Mécanisme de gestion de portefeuille

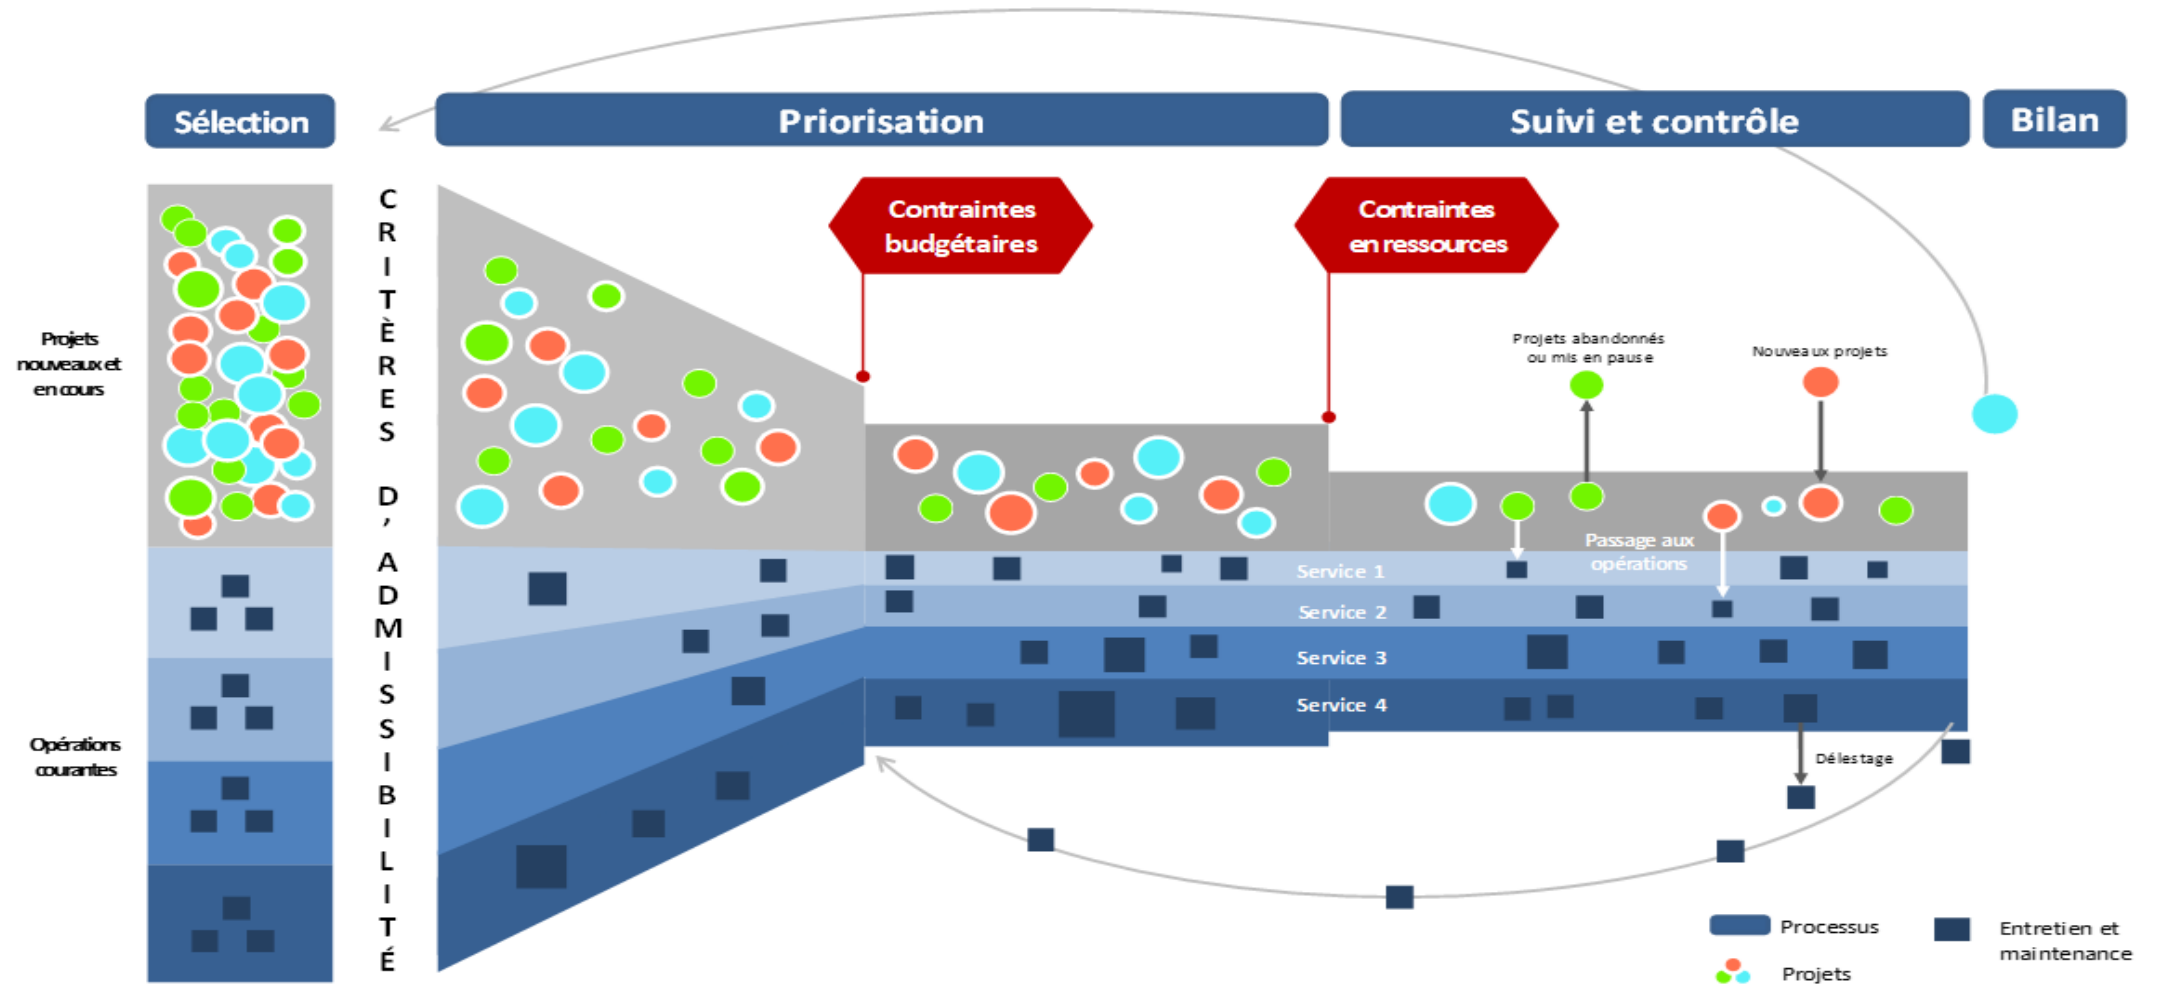

Organisation et Gestion par Projets (6)

Portefeuille/ Programme / projet

- **Portefeuille**: un ensemble de projets, de programmes, de sous portefeuilles et des opérations, gérés en tant que groupe dans le but d'atteindre des objectifs stratégiques. Les projets ou les programmes du portefeuille ne sont pas nécessairement interdépendants ou directement liés.
- **Programme** : un groupe de projets apparentés et coordonnés dans un but commun pour tirer bénéfices supérieurs que en mode d'un seul projet.
- **Un projet** est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique
 - Un nouveau produit ou service
 - Une amélioration d'un produit ou d'un service existant.

Quelques statistiques: !? (avant intro de l'agilité)

- 30% des projets abandonnés avant la fin.
- 54% des projets livrés hors budget
- 66% livrés en retard
- 82% des entreprises n'ont pas de processus d'évaluation des causes d'échecs des projets

Sources d'erreurs ou d'échecs des projets:

- 56%: besoins non bien définis ou mal compris
- 27%: conception
- 7% code (erreur d'exécution)
- 10% autres

Projet vs opérations ?

■ Opérations et projets :

- Contraints par des ressources limitées
- Planifiés, exécutés et contrôlés

■ Opérations : continues et répétitives

■ Projets : temporaires et uniques

CARACTÉRISTIQUE	OPÉRATION	PROJET
Originalité	Courante	Particulière
Fréquence	Répétitive	Unique
Décisions associées	Réversibles	Irréversibles
Variables influentes	Rares et endogènes	Nombreuses et exogènes
Perturbations	Identifiables et rectifiables	Difficiles à déceler et coûteuses à corriger
Impacts futurs	Effets prévisibles et mesurables	Effets estimés a priori et mesurés a posteriori
Marge de liberté	Faible Standardisation élevée	Élevée en phases initiales Créativité nécessaire

Performance opérationnelle d'une organisation



Facteurs environnementaux

- les conditions qui ne sont pas sous le contrôle immédiat de l'équipe projet et peuvent influencer le projet d'une façon négative ou positive.

- la culture, la structure et la gouvernance organisationnelle

- L'infrastructure

- Les RHs;

- Le climat politique

- Les systemes de gestion de projet,

- ...
 - Les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels constituent des entrées pour la plupart des processus de planification de management des projets



Actifs organisationnels

- C'est le capital informationnel de l'organisation:



- Processus, politiques internes, directives et Procédures.

- Base de connaissance de l'entreprise (Plans, les leçons apprises et les informations historiques, bases des donnee,..)

Introduction aux Méthodes et process

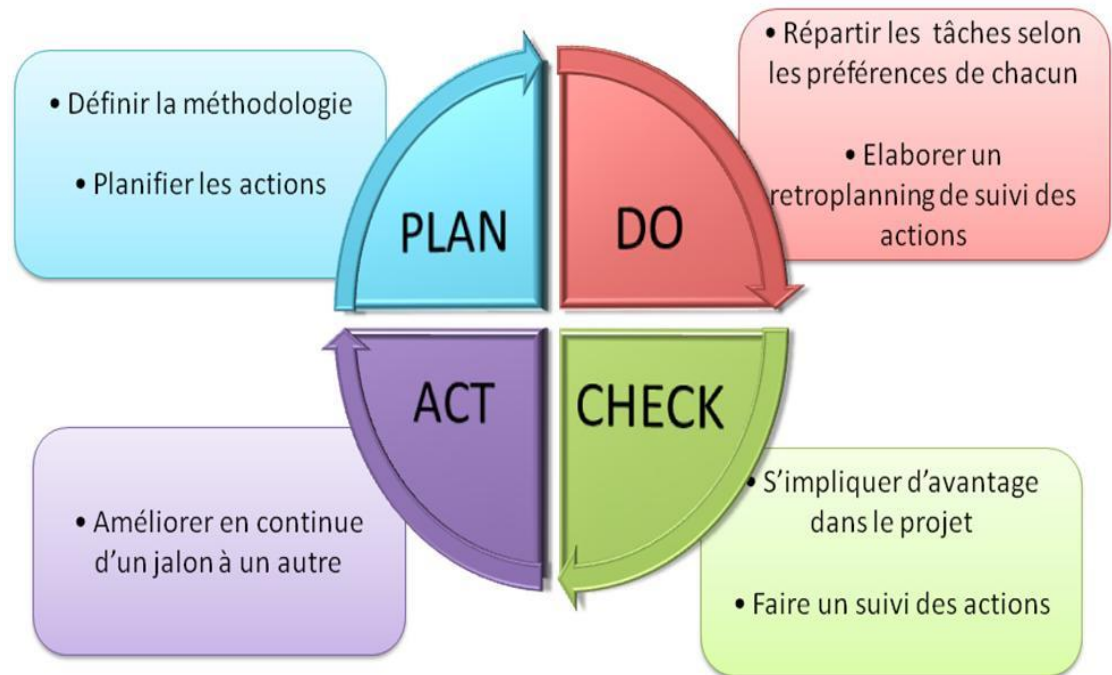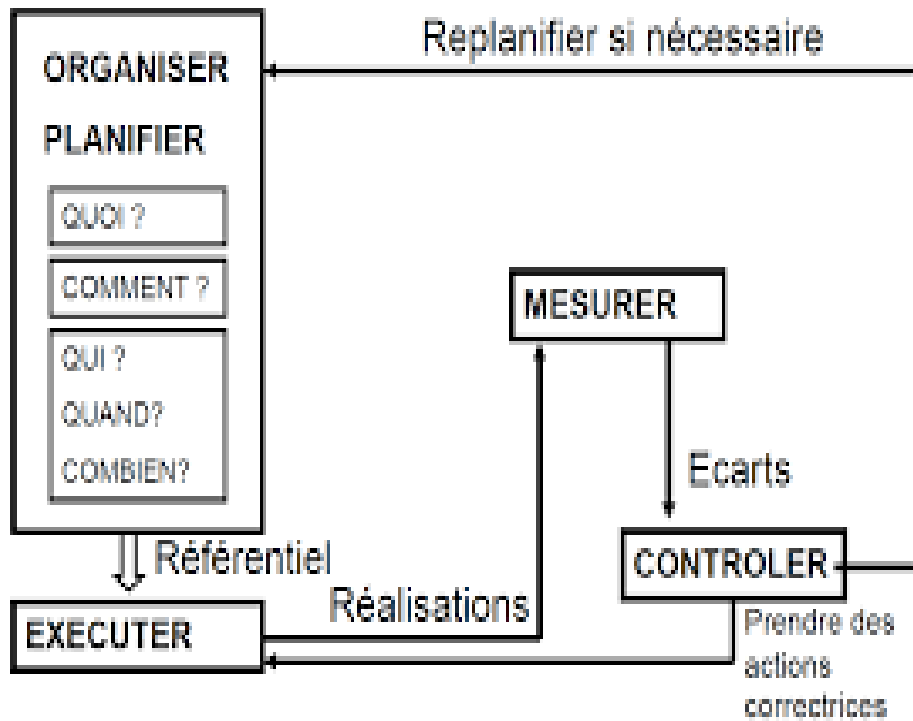

Notion du Jalon

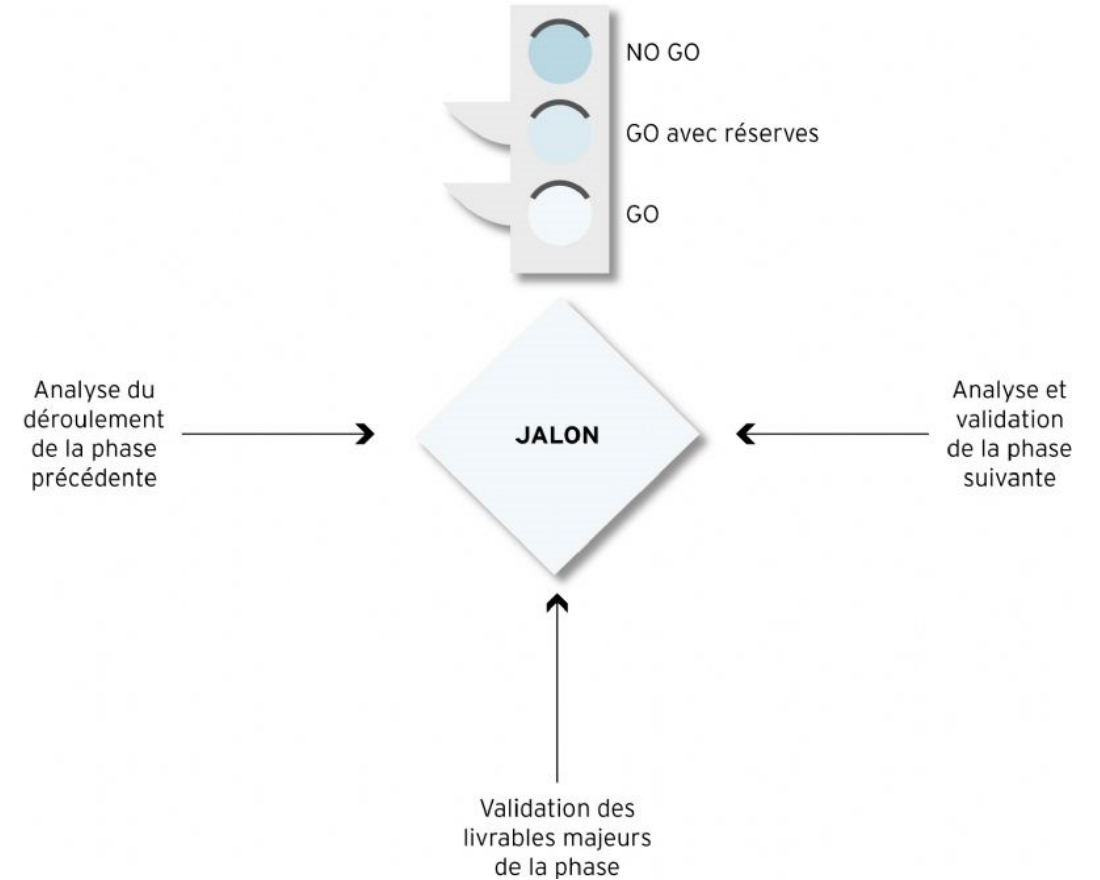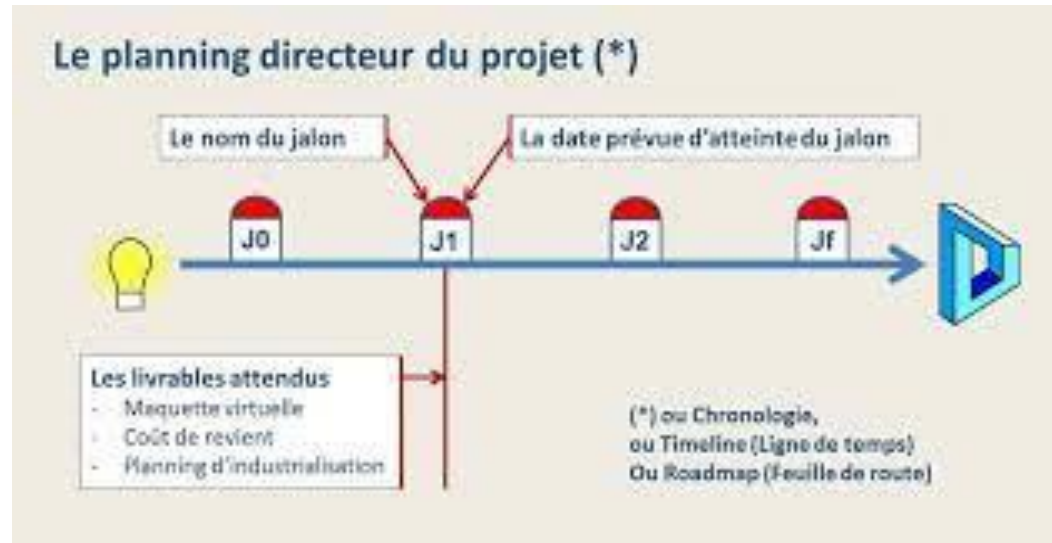

Définition d'un projet

- Un projet est un ensemble unique d'actions coordonnées avec des dates définies de début et de fin, entreprises par un individu ou une entité pour atteindre des objectifs spécifiés en respectant des paramètres de coûts, délais et performances
- Un projet est un ensemble d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini, dans le cadre d'une mission précise et pour la réalisation desquelles on identifie non seulement un début, mais aussi une fin (AFNOR)
- Un projet est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique
 - Un nouveau produit ou service
 - Une amélioration d'un produit ou d'un service existant.

Un projet est temporaire

- Début et fin définis
- Fin : objectifs atteints ou abandon
- Durées variables
- Le caractère temporaire ne s'applique pas à « l'ouvrage ou produit »
- Le caractère temporaire est imposé pour le projet pour la disponibilité des ressources

Un projet est unique

Un projet nécessite obligatoirement de créer quelque chose n'ayant jamais été fait avant même si la catégorie de l'ouvrage est connue

Les enjeux d'un projet


■ Un projet est un ensemble de tâches dépendantes destinées à la réalisation d'un objectif unique et mesurable avec :

- Des spécification et des contraintes (Contenu)
- Des moyens humains, financiers et matériels (Couts)
- Des délais,

■ Caractéristiques d'un projet :

- Il est unique
- Il y a un commanditaire (sponsor)
- Il y a un chef de projet
- Fait dans un objectif précis.
- Possède un début et une fin (échéancier)
- Possède un budget

Le triangle d'or de projet

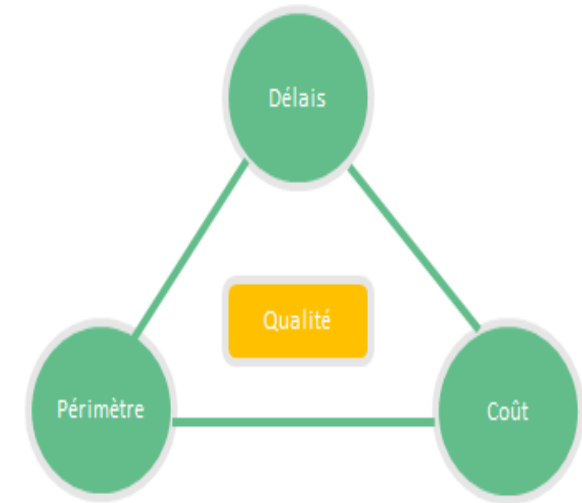

OTOBOS: On Time, On Budget, On Scope

Quelles compétences doit avoir un chef de projet?

1-Comportement: savoir manager les équipes internes et externes (Influence, instaurer un climat de confiance, accompagnement, gestion des conflits, proactif, motiver, écoute active, responsabiliser les équipes...)

2-Connaissance: Une maîtrise des processus de gestion de projet, identification et résolution des pbs/des risques

3- Esprit Orienté Performance: dans l'accomplissement des tâches (efficacité/efficience/pertinence)

+ Une maîtrise d'utilisation des outils


* MS Project / EPM Microsoft, Primavera, ..., pour la gestion opérationnelle des projets (planification, budget, délais, ...)

* Teams, ..., pour la gestion collaborative des projets



Parties prenantes du projet (PP)

- Les parties prenantes: des personnes ou des organisations qui prennent une part active au projet ou ses intérêts peuvent être affectés positivement ou négativement par le projet.
- l'identification des PPs: tenir compte des intérêts, de l'impact et de l'influence (3i).
- **L'équipe de projet**: le personnel de mgt de projet, le personnel de projet, les experts de soutien, les représentants des clients, les partenaires dans le projet.
- **Le bureau de projet** (PMO:project Mgt Office)
est une structure qui normalise la gouvernance des projets, facilite le partage des ressources, des outils entre les projets

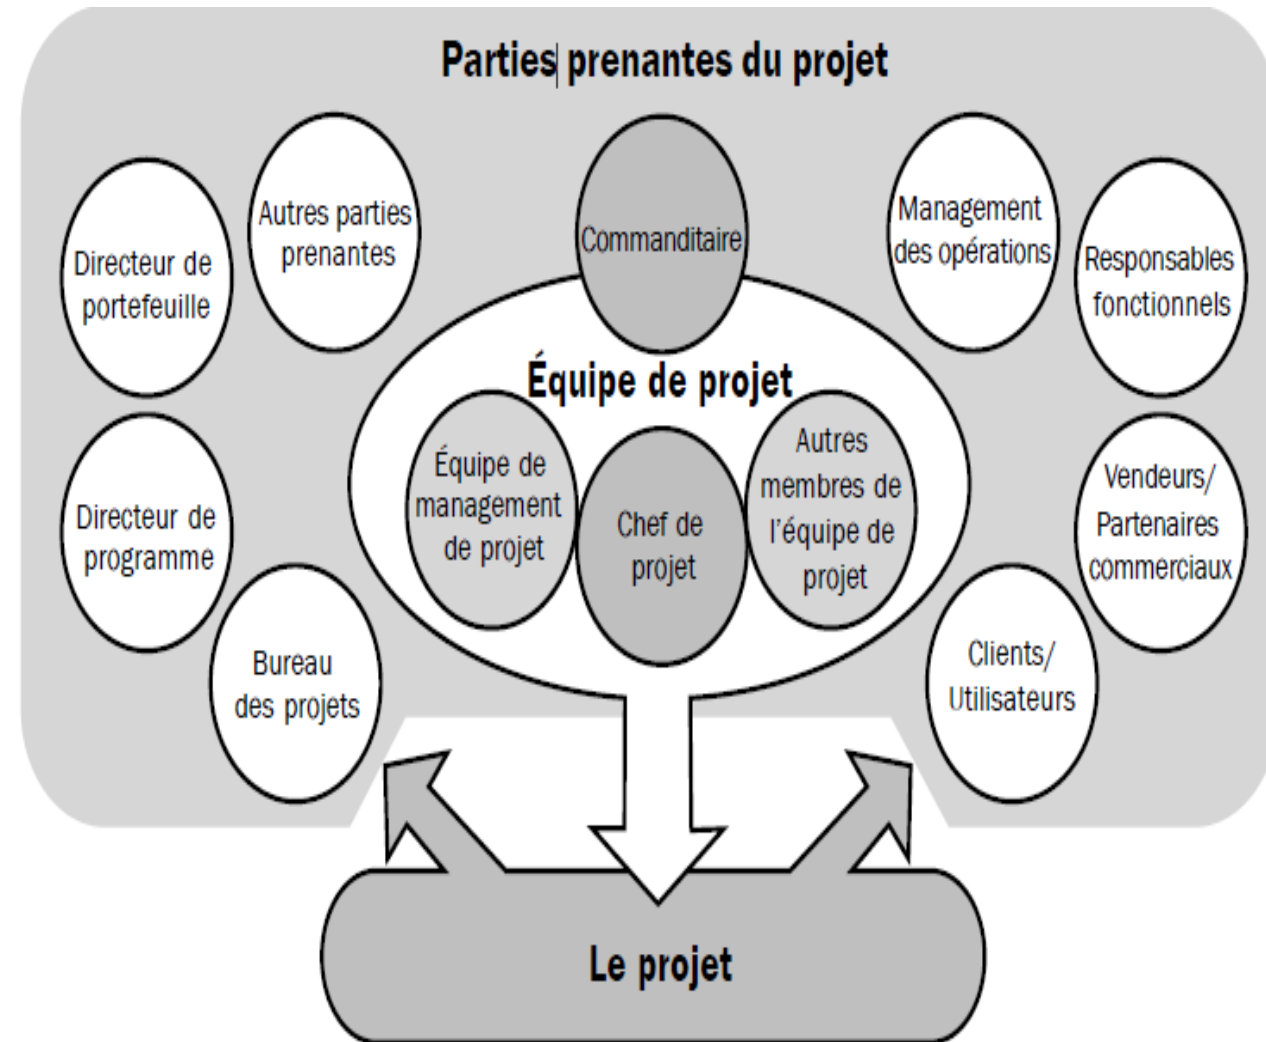

Qu'est-ce que la gestion de projet ?


- Application de connaissances, compétences, techniques et outils aux activités d'un projet.
- Satisfaire ou dépasser les besoins et attentes des PP.
- Le management de projet consiste à planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet, de façon à atteindre les objectifs en respectant le contenu, les coûts et les délais...

Livrables/Cycle de vie de projet vs cycle de vie de management de projet




Modèles de cycle de vie de projet

- Cycle de vie prédictif: totalement planifié
(modèle en cascade- Waterflow Model)

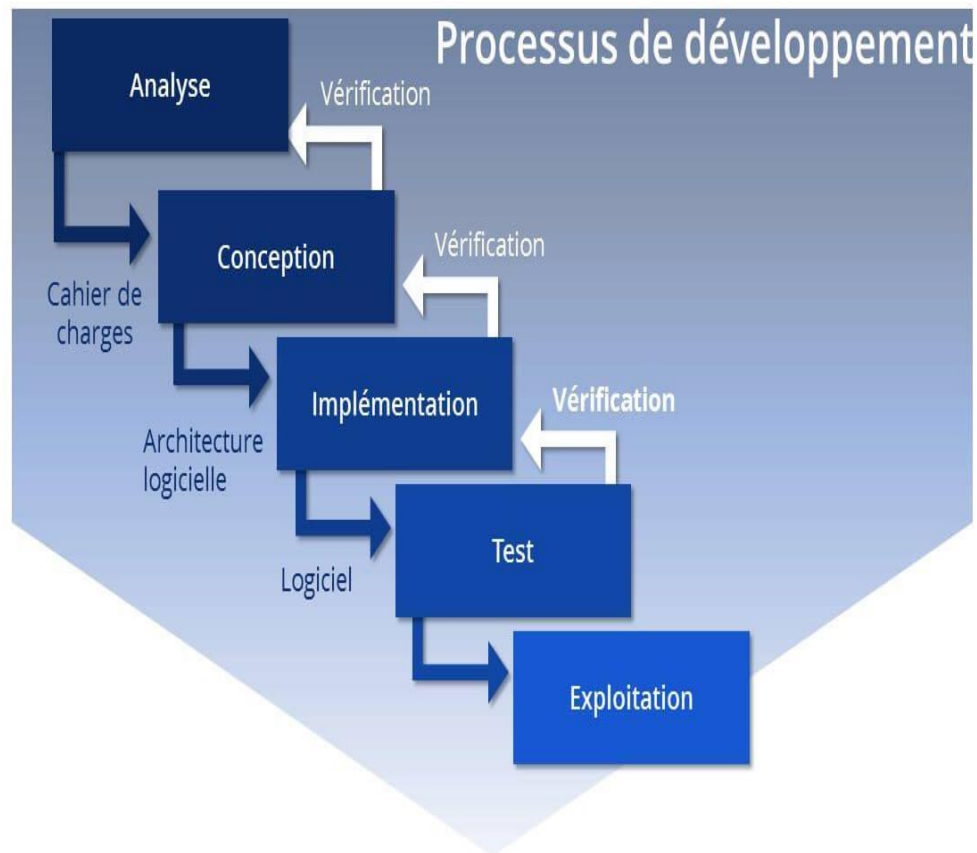

Cycle de vie itératif et incrémental

- Itératif : le processus de développement est appliqué plusieurs fois
- Incrémental : chaque itération augmente la quantité d'information
- Une amélioration du modèle en cascade



- En cascade: exploitation des versions qu'à la fin du projet
- Incrémental: exploitation partielle (en plusieurs versions)
- le cycle adaptatif (introduction de l'agilité)

Principes directeurs pour le succès de projet

-  1 **Le sponsoring à haut niveau**
-  2 **Le périmètre est défini, réaliste et activement contrôlé
Les livrables et le processus d'approbation sont définis et clairs**
-  3 **Les standards qualité sont définis et maîtrisés (internes et externes)**
-  4 **Les délais sont maîtrisés et Le travail est planifié et géré avec efficience**
-  5 **L'équipe est motivée et exemplaire**
-  6 **Toutes les parties prenantes sont impliquées et maintenues satisfaits**
-  7 **Les coûts sont maîtrisés et les gains escomptés mesurés**
-  8 **Les risques sont anticipés et atténués à temps**

TD1: Calcul de rentabilité économiques des projets

Présentations MiniProjets: méthodes selection des projets

Indicateurs de calcul de rentabilité économiques des projets

Cashflow : Le mot cash flow est un mot anglais qui signifie en français les flux de liquidités que l'entreprise génère de ses activités. En d'autres termes, c'est de l'argent liquide qui reste dans l'entreprise en déduisant toutes les charges réellement décaissées.

Calcul de la VAN

VAN = Revenu-Dépenses ou VAN La VAN est un indicateur qui permet de prendre la décision quant à la rentabilité ou pas d'un projet d'investissement. Et bien le fonctionnement de la VAN est tout simple, il consiste à comparer **les gains d'un projet à son investissement initial**.

Comparer les cash flows générés d'un projet avec la mise investie dans ce même projet. Alors faites attention quant on parle de comparaison en finance, il faut absolument comparer des choses comparables. Juste à titre d'exemple, un DT d'aujourd'hui ne sera plus le même dans deux ou trois ans. Pour cela il faut actualiser les cash-flows futurs pour obtenir la valeur actuelle, c'est à dire la valeur des cash flows au tout début du projet pour pouvoir les comparés avec l'investissement initial.

Indicateurs de calcul de rentabilité économiques des projets

2-Valeur actuelle (présente) ou Present Value Valeur présente d'un flux futur

$$VA = VF / (1 + \text{taux})^n$$

3-Valeur future ou Future Value Valeur présente actualisée $VF = VA (1 + \text{taux})^n$

4- Analyse coût/Bénéfices (Benefice cost ratio = BCR) Evaluer le total des coûts attendus par rapport au total des bénéfices escomptés d'une ou de plusieurs actions, afin de déterminer quelle action est la meilleure ou la plus rentable ($B/C=1$, inf ou sup à 1)

5- Taux de rendement Interne (TRI) ou Internal Rate of Return (IRR) Taux d'escompte (d'actualisation) tels que les flux positifs et les flux négatifs du projet se compensent pour aboutir à une valeur actuelle nulle (point mort) => Temps de retour d'investissement.

Interprétation

Dans la pratique, si l'entrepreneur devait choisir entre plusieurs projets, il est évident qu'il maintient le projet dans la valeur actuelle nette est plus élevé mais d'autres facteurs peuvent impacter cette décision (durée de vie économique, critères de financement, exigence du point mort tel que le temps de retour d'investissement...)

Exercice d'application

Année	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses	50	60	70			
Revenu	0	0	0	60	100	200
Cash flow (Revenu-dépenses)	-50	-60	-70	60	100	200
Taux d'intérêt (6%)	6%					
Cash flow actualisé $VA=VF/(1+taux)^n$	-47.2	-53,4	-59	47.52	74.72	141
Cash flow actualisé cumulé	-47.2	-100.6	-159.6	-112.08	-37.36	103.64

Net Present
value

